


10 leerpunten over baggeren Oostelijke Vechtplassen

10-4-25

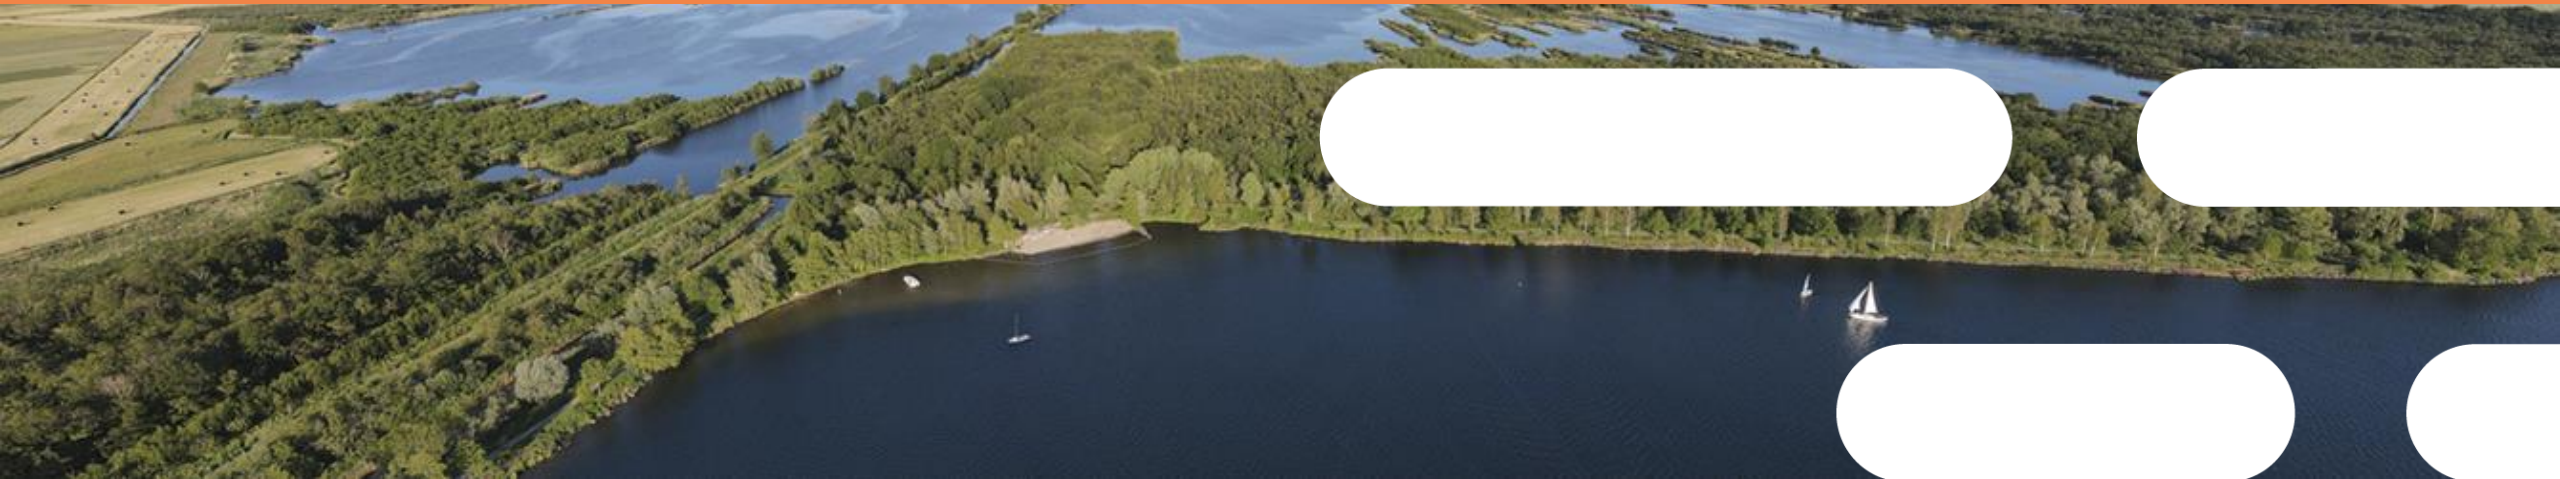

Agenda

10 leerpunten uit OVP

- Samenwerkingsverband
- Organisatie en besluiten
- Inzet van kennis
- Pilot
- Baggeren in 4 fasen
- Beheer
- Samenvatting en Afsluiting



Plangebied Oostelijke Vechtplassen



Samenwerkingsverband OVP

Brede samenwerking op basis van opgaven

- Baggeren, Waterkwaliteit, Natuurdoelen, exoten
- Recreatie
- Aanzicht van het dorp, parkeren
- Beschikbaarheid van baggerdepots
- Uitzicht op beheer van de plas
- Door 27 partijen ondertekend

Organisatiestructuur

- Werkgroep – baggerplatform – programmateam – Regiegroep – Stuurgroep
- Inbreng vanuit bewonerscollectief en de recreatiesector
- Alle partijen binnenboord houden




Zorg voor voldoende kennis over baggeren

- Ervaring meenemen uit Reeuwijk
- Slib ligt aan westkant van de plas en luwe plekken zoals havens
- Aannemer op basis van kennis sturen
- Perceptie aanscherpen dat bagger in de havens niet van het waterschap is, maar eigendom is van de ondernemer.



Pilot van Win-win situatie

- 2 problemen oplossen, legakker en slib
- Legakker aanleggen met slib
- Laten zien dat OVP daadkrachtig is
- Vier het succes
- Regel het beheer.






Baggeren OVP (2027-2027)

Fase 1 Baggeren plassen slib (tbv diepte voor scheepvaart)

Fase 2 Baggeren jachthavens


Fase 3 (onderzoek) baggeren overige deelgebieden

Fase 4 Beheerplan voor na 2027 (einde OVP)

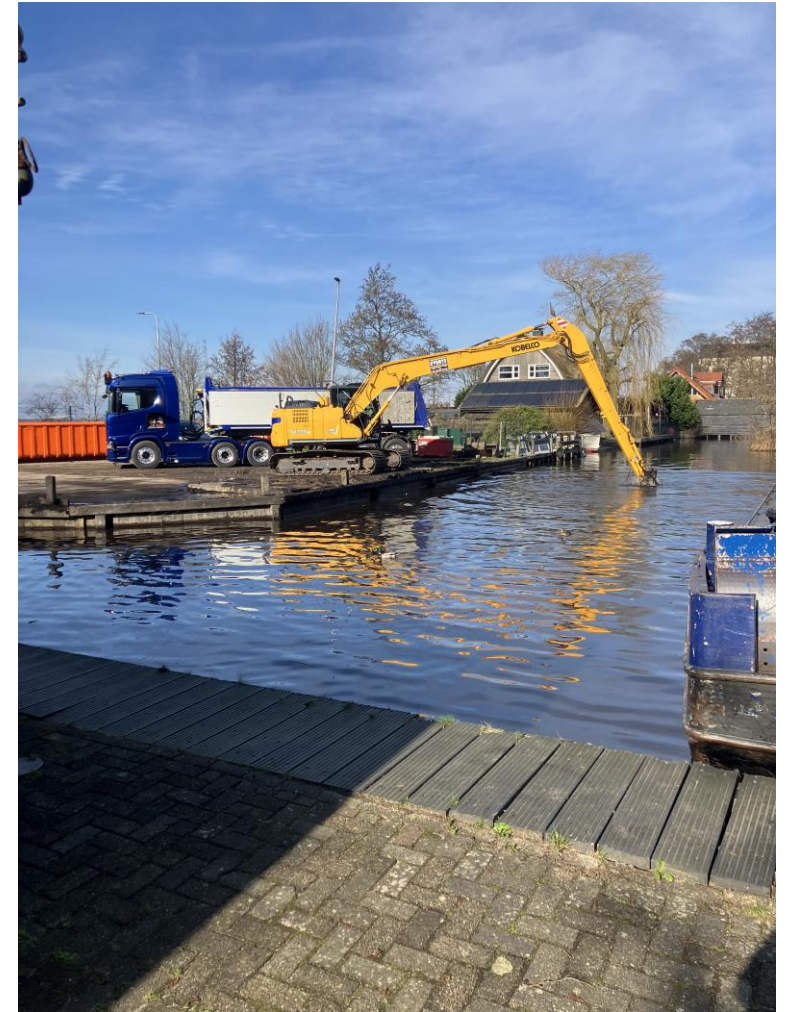


Baggeren Fase 1

- Uitgebreid onderzoek en inmeten plassen
- Gezamenlijk scope vaststellen
- Baggeren op plaatsen waar teveel slib ligt in de plassen
- Depotlocatie gezamenlijk vaststellen (polder Mijnden)
- Uitvoeren project door OVP

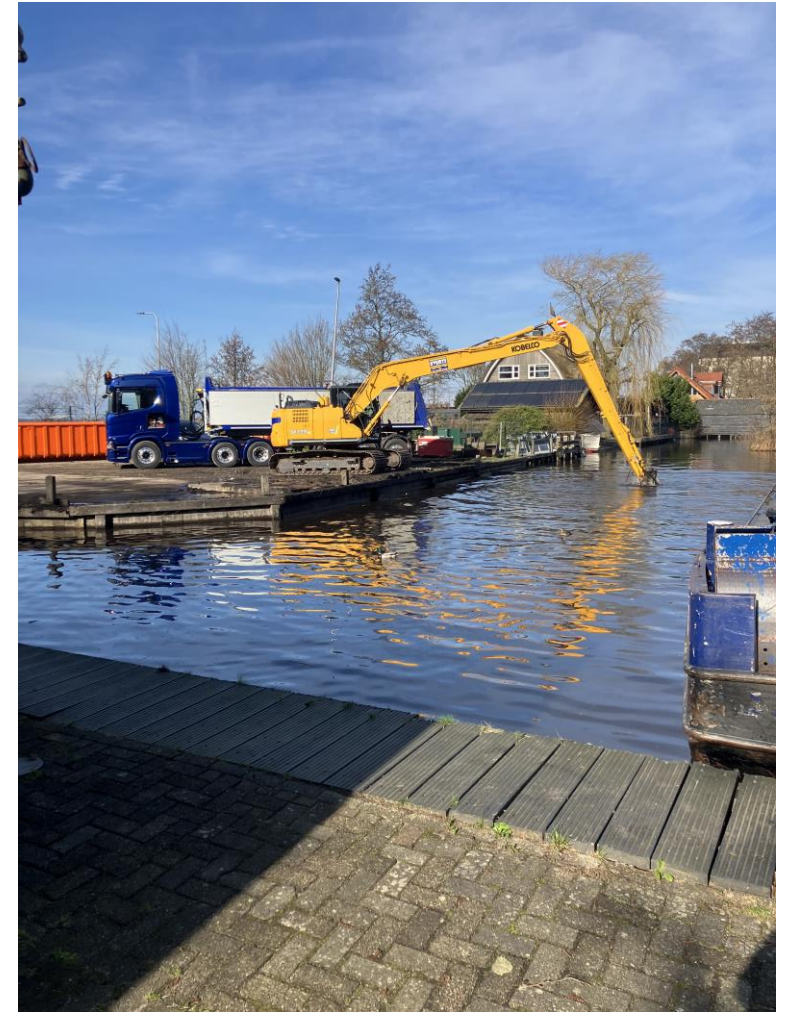

Baggeren Fase 2

- Initiatief bij ondernemers
- Gebiedsakkoord biedt incentive voor baggeren havens, maar incentive is te laag. Geen beweging.
- Gezamenlijk nieuwe incentive vastgesteld
- Financieringsregeling vaststellen
- Uitvoering in 2025 -2027

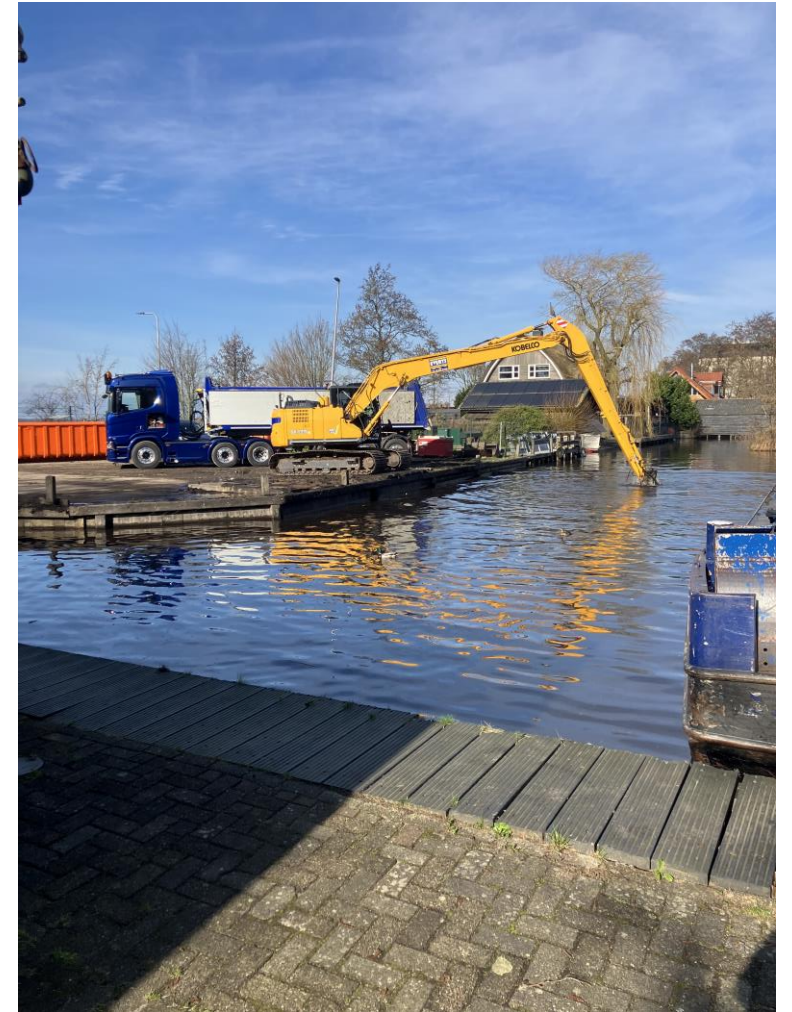

Baggeren fase 3

- Niet opgenomen in Gebiedsakkoord
- Alleen bij voldoende budget
- In onderzoek
- Depots in gebied

Baggeren fase 4

- Beheerplan opstellen met incentive
- Financiering uit bv toeristenbelasting



Samenvatting en afsluiting

- Samenwerken en Gebiedsakkoord afsluiten
- Baggeren speerpunt maken
- Kennis is belangrijk
- Zorg dat alle partijen binnenboord blijven
- Zoek naar win-win situaties
- Beheer van de plas vormgeven
- Zorgen voor incentives om illegaliteit te voorkomen
- Pilot uitvoeren en succes vieren
- Laat Provincie de regie voeren
- Voorkom vage besluiten door de SG



Einde

Vragen, opmerkingen, suggesties?

